（様式-1）

工　程　表

（工事名）新名神高速道路　猪名川橋(PC上部工)工事

（会 社 名）

住　　所　名古屋市中区丸の内1丁目17番19号

会 社 名　株式会社 ピーエス三菱 名古屋支店

代 表 者　執行役員支店長 森 勝茂

（路 線 名）

高速自動車道 近畿自動車道 名古屋神戸線

（工事区間）

（自）兵庫県川西市石道　(STA 46＋55　)

（至）兵庫県川西市石道　(STA 54＋00　)

（工　期）

（自）平成 25年 2月 27日

（至）平成 29年 2月 5日(1, 440日間)

（線上に計画出来高 %）

50

前月迄　今月　翌月以降

下線に実施出来高 %

項目	数量	単位	平成24年度 2月 (1)	3月 (2)	平成25年度 4月 (3)	5月 (4)	6月 (5)	7月 (6)	8月 (7)	9月 (8)	10月 (9)	11月 (10)	12月 (11)	1月 (12)	2月 (13)	3月 (14)
準備工	1	式														
詳細設計	1	式	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
橋梁下部工	1	式														
橋梁上部工	1	式														
橋梁付属物工	1	式														
雑工	1	式														
跡片付け	1	式														
全体			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

項目	平成26年度 4月 (15)	5月 (16)	6月 (17)	7月 (18)	8月 (19)	9月 (20)	10月 (21)	11月 (22)	12月 (23)	1月 (24)	2月 (25)	3月 (26)
準備工												
詳細設計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
橋梁下部工				0.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	36.5	36.5	36.7
				0.0	0.0	18.7	18.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
橋梁上部工							0.0	2.2	4.3	11.0	14.6	7.4
							0.0	2.2	4.3	4.3	5.4	8.5
橋梁付属物工				0.0	8.7	12.9	15.0	19.0	21.4	31.1	40.5	33.1
				0.0	0.0	6.0	11.1	18.0	18.4	20.5	22.5	33.1
雑工												
跡片付け												
全体	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	1.9	5.0	6.6	6.9	8.1	8.7
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	1.9	5.0	6.6	6.9	8.1	8.7

項目	平成27年度 4月 (27)	5月 (28)	6月 (29)	7月 (30)	8月 (31)	9月 (32)	10月 (33)	11月 (34)	12月 (35)	1月 (36)	2月 (37)	3月 (38)
準備工												
詳細設計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	100
	0.0	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	81.2	100.0	100.0	123.1
橋梁下部工	36.7	36.7	54.4	60.8	60.8	60.8	60.8	85.5	85.5	85.5	89.3	89.5
	54.4	54.4	72.6	72.6	79.0	79.0	86.6	86.6	86.6	88.4	89.3	89.5
橋梁上部工	9.5	15.7	20.4	33.8	44.5	54.5	57.1	64.6	74.0	78.2	84.1	75.3
	9.5	13.6	18.9	27.8	32.1	44.6	49.3	55.0	58.8	62.4	62.4	75.3
橋梁付属物工	38.6	45.2	58.5	61.3	70.6	75.3	78.5	84.0	84.2	84.2	84.2	89.9
	47.5	51.9	58.7	58.7	58.7	68.4	71.4	81.5	81.9	89.0	89.9	89.9
雑工												
											0.0	0.0
跡片付け												
全体	9.3	9.9	14.4	18.9	23.4	33.3	43.2	53.1	57.4	61.7	66.1	76.4
	9.3	9.9	14.4	18.9	23.4	33.3	43.2	53.1	57.4	61.7	66.1	76.4
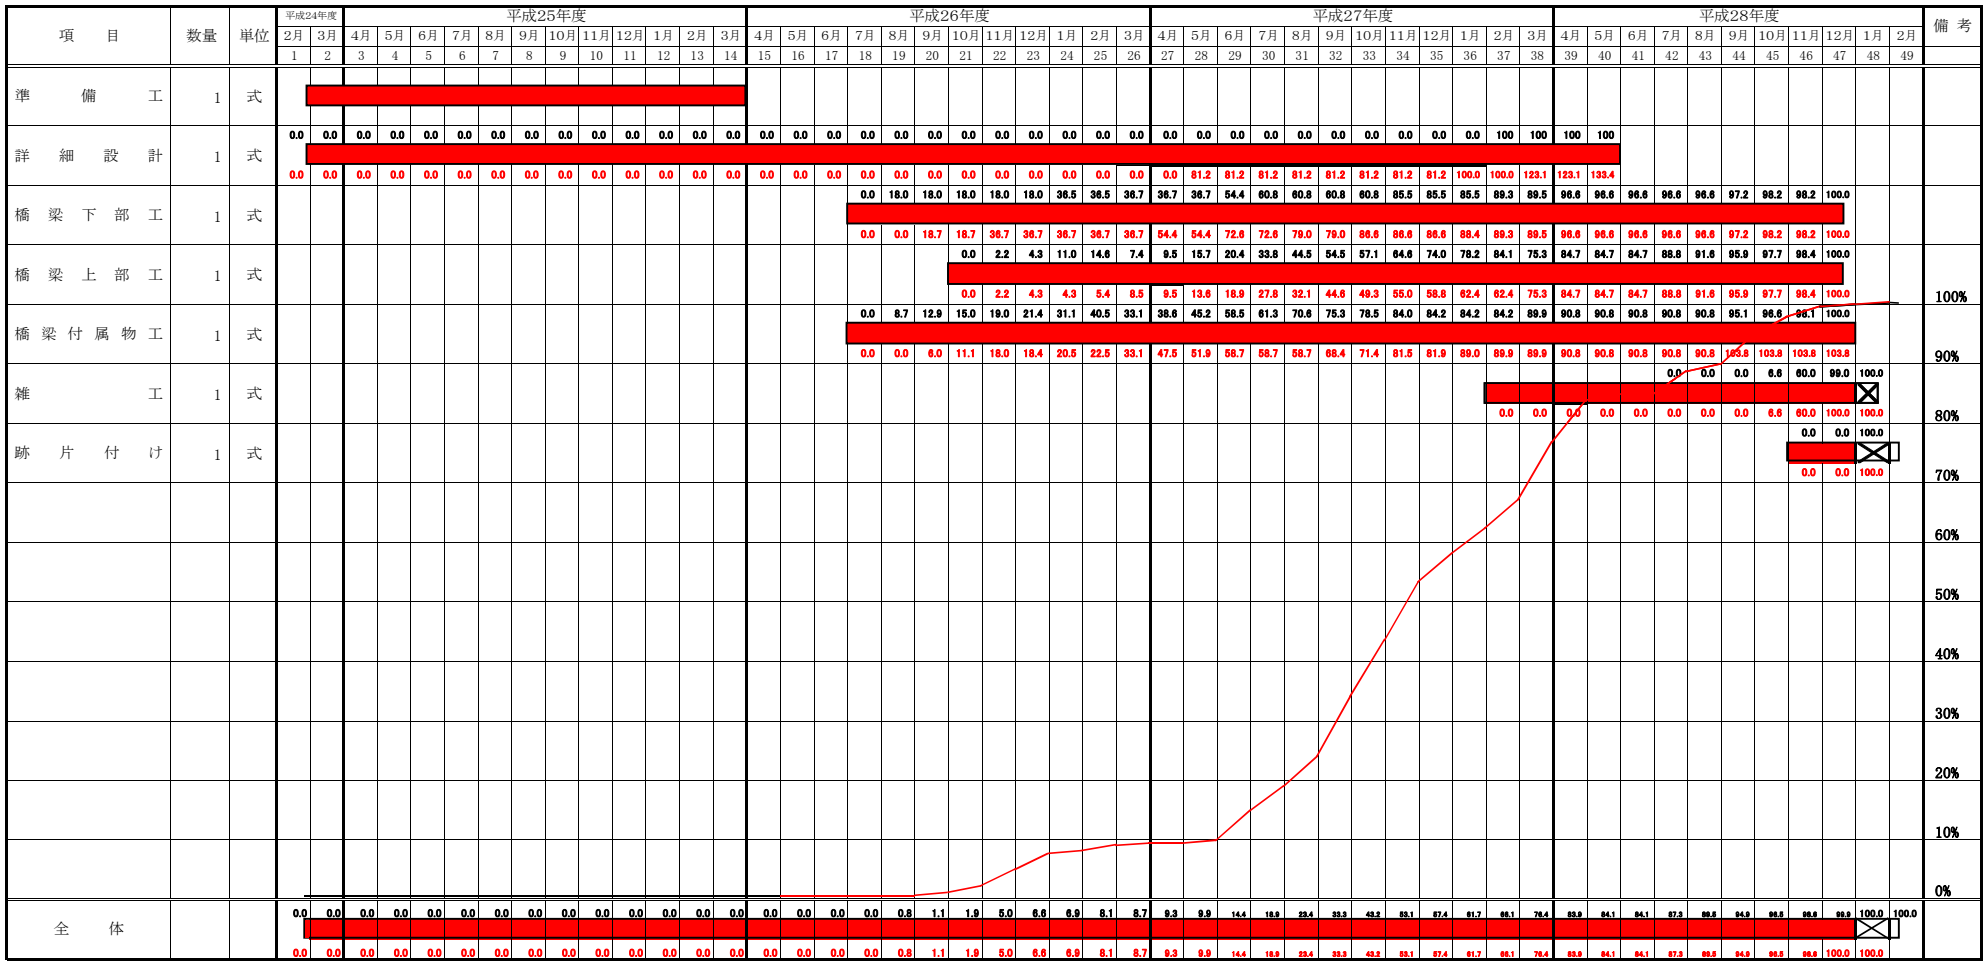
項目	平成28年度 4月 (39)	5月 (40)	6月 (41)	7月 (42)	8月 (43)	9月 (44)	10月 (45)	11月 (46)	12月 (47)	1月 (48)	2月 (49)	備考
準備工												
詳細設計	100	100										
	123.1	133.4										
橋梁下部工	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	97.2	98.2	98.2	100.0			
	96.6	96.6	96.6	96.6	96.6	97.2	98.2	98.2	100.0			
橋梁上部工	84.7	84.7	84.7	88.8	91.6	95.9	97.7	98.4	100.0			
	84.7	84.7	84.7	88.8	91.6	95.9	97.7	98.4	100.0			
橋梁付属物工	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	95.1	96.6	98.1	100.0			
	90.8	90.8	90.8	90.8	90.8	103.8	103.8	103.8	103.8			
雑工				0.0	0.0	0.0	6.6	60.0	99.0	100.0		
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	60.0	100.0	100.0		
跡片付け								0.0	0.0	100.0		
								0.0	0.0	100.0		
全体	83.9	84.1	84.1	87.3	89.8	94.9	96.8	98.8	99.9	100.0	100.0	
	83.9	84.1	84.1	87.3	89.8	94.9	96.8	98.8	100.0	100.0
